

Dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen

Het dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede – Amerongen heeft een totale lengte van 11 km. Het traject ligt in twee gemeenten: Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Bij dit project wordt de dijkversterking zoveel mogelijk gecombineerd met ruimtelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld mogelijkheden voor natuur en recreatie. De realisatiefase is gestart en loopt naar verwachting door tot en met 2027.

**STERKE
LEKDIJK**

In deze nieuwsbrief leest u over:

- Stremming van de Lekdijk - 17 februari
- Afsluiting Lekdijk Oost - 2 maart
- Inloopavond Lekdijk Oost - 18 februari
- Algemene informatiebijeenkomst - 26 maart



Voorwoord

Beste bewoners en geïnteresseerden, Wat vliegt de tijd! We zijn inmiddels alweer een half jaar buiten aan het werk en de eerste mijlpalen zijn bereikt.

Na het plaatsen van de damwand bij kasteel Duurstede kon de weg daar weer open. Ook is alle benodigde klei via de loswal in de Gravenbol aangevoerd en zit de damwand bij de Rijndijk 1b-d inmiddels in de grond. De weg is daar weer open, wat voor de bewoners van de dijk prettig is na een paar weken omrijden.

Het werken aan de dijk blijft een uitdaging. Helaas kunnen we stremmingen niet altijd voorkomen, omdat we zo het werk veilig kunnen blijven uitvoeren. Omdat er dit jaar nog veel meer op de planning staat, organiseren we waarschijnlijk op donderdagavond 26 maart een informatiebijeenkomst in Wijk bij Duurstede.

Noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt snel.

Veel leesplezier!



Margreet van Zee

Omgevingsmanager
Wijk bij Duurstede - Amerongen

Margreet.van.zee@hdsr.nl
06 126 15 697

Wat komt eraan?

Tijdelijke afsluitingen en informatiebijeenkomst

Ditmaal is de damwand bij Lekdijk 2 in Amerongen aan de beurt; ook daar moet de weg tijdelijk dicht. Daarnaast starten in Wijk bij Duurstede de werkzaamheden aan weerszijden van de dijk tussen de Irenesluizen en sportpark De Marienhoeve. Hierdoor is de weg enkele weken afgesloten. Het zal daardoor wat drukker worden in het centrum.

Wilt u hier meer over weten?

Kom dan op woensdagavond 18 februari tussen 18.30 en 20.00 uur naar onze inloop-informatiebijeenkomst in de keet aan Lekdijk Oost 11a in Wijk bij Duurstede.

Het is geweldig om te zien dat de BouwApp inmiddels ruim 1500 volgers heeft. Heeft u die al geïnstalleerd? Door de BouwApp blijft u goed op de hoogte van alles wat er speelt, echt een aanrader.



de **BouwApp**.

BouwApp nog niet geïnstalleerd?

Download de BouwApp via de [playstore](#) of [appstore](#) en ontvang alle updates op uw telefoon.



We gaan weer aan de slag!

In dit deel van de nieuwsbrief geven we u een doorkijk naar de werkzaamheden die in 2026 op de planning staan. Zo krijgt u alvast een beeld van wat u het komende jaar kunt verwachten.

Bij een dijkversterking zijn we afhankelijk van verschillende factoren, zoals het weer en de beschikbaarheid van machines. We hebben ons best gedaan om een zo duidelijk en compleet mogelijk overzicht te maken. Tegelijkertijd geldt dat een planning nooit helemaal vaststaat.

Als er veranderingen zijn, informeren wij u hierover via de BouwApp en in een volgende nieuwsbrief.



Werkzaamheden op dit moment

Buitenpolder (binnendijks)

In dijkvak Buitenpolder ronden we het binnendijkse werk af. Tot en met december hebben we damwanden geplaatst. Nu werken we de taluds netjes af en verwijderen we de rijplaten. We zijn iets later gestart, omdat de dijk na het smelten van de sneeuw te nat was om veilig te werken.

Op 17 februari starten we met grondwerk bij Lekdijk 2. Daarna plaatsen we damwanden. Net als bij Rijndijk 1b/c/d staat de woning hier dicht bij de dijk. Daarom plaatsen we een kraan op de dijk en wordt de weg bij Amerongen tijdelijk afgesloten. De afsluiting start op dinsdag 17 februari en duurt naar verwachting tot en met half maart.

Bewoners ten oosten van de afsluiting kunnen via Amerongen de dijk verlaten. Bewoners en bedrijven ten westen van de afsluiting bereiken hun bestemming via Wijk bij Duurstede. De pendelbus blijft rijden, maar volgt tijdelijk een andere route. Gebruikers krijgen hierover apart bericht.



Kaart 1: Locatie van de stremming ter hoogte van Lekdijk 2

Buitenpolder (buitendijks)

In dijkvak Buitenpolder werken we aan de buitenkant van de dijk. We maken de dijk hier sterker met klei. Deze werkzaamheden zijn begonnen op 9 februari. Langs dit deel van de dijk staan bijzondere knotwilgen. Om deze bomen te behouden, hebben we ze eerst geknot (gesnoeid) en daarna verplaatst naar een andere plek verder van de dijk. Sommige bomen kunnen niet verplaatst worden. Daarom planten we op die plekken nieuwe wilgenstaken. Zo kunnen we aan de dijk werken en blijven er toch knotwilgen in het gebied.



Afbeelding 1: verplaatsing van een knotwilg

Lunenburgerwaard Oost

In dijkvak Lunenburgerwaard Oost zijn we bezig met de laatste werkzaamheden aan de buitenkant van de dijk. Ook hier was de dijk tijdelijk te nat door smeltende sneeuw. De klei die hier is weggehaald, hebben we aan de binnenkant van de dijk gebruikt, bij Lekdijk 13 in dijkvak Sluis Amerongen. Daar leggen we een steunberm aan met klei van buiten de dijk. Dit werk is bijna klaar.

In dit dijkvak lag ook het drijvende laad- en losplatform (ponton) voor de aanvoer van klei. Alle klei is inmiddels ontvangen, gebruikt of opgeslagen in het depot. Daarom is het ponton begin dit jaar weggehaald.

Lunenburgerwaard West

Begin januari zijn we gestart met het aanbrengen van damwanden bij Rijndijk 1b/c/d en wordt op vrijdag 20 februari afgerond. Omdat er een heimachine op de dijk stond, was de weg tot en met 13 februari helemaal afgesloten in de richting van Wijk bij Duurstede.

Door het winterweer eerder dit jaar liepen andere projecten vertraging op. Daardoor kwamen machines later beschikbaar voor dit werk. Om toch op tijd klaar te zijn, hebben we extra maatregelen genomen. We werkten langer door en ook op zaterdag zijn we aan het werk geweest. Die extra

dag hebben we gaten voorgeboord in de grond. Daardoor konden de damwandplanken makkelijker worden geplaatst. Zo konden we het werk op tijd afronden.

Waterfront



Vanaf maart vervangen we de damwand aan de westzijde van het inundatiekanaal. De voorbereidingen zijn al begonnen. We hebben proefsleuven gegraven om te onderzoeken hoe de nieuwe damwand moet aansluiten op de

oude inundatiesluis. Dit hebben we heel zorgvuldig gedaan omdat het om UNESCO-werelderfgoed gaat.

Het werk voeren we uit vanaf een werkplatform op het water (een ponton) in het inundatiekanaal. Om daar ruimte voor te maken, worden de woonboten die nu in het kanaal liggen tijdelijk verplaatst naar de haven.

In maart starten we met het verplaatsen van de woonboten en het plaatsen van de damwand. De werkzaamheden starten op maandag 2 maart en zijn naar verwachting begin mei klaar.


Kanaaldijk

Op maandag 2 maart beginnen we met de voorbereidingen voor het plaatsen van damwanden en het aanbrengen van klei aan de buitenkant van de dijk. Er wordt zowel binnen- als buitendijks gewerkt.

Van week 10 tot en met week 15 (zes weken vanaf 2 maart) is de Lekdijk Oost tussen het sportpark en de Prinses Irenesluis afgesloten voor verkeer. Het sportpark en de veerpont blijven wel bereikbaar. Na deze periode is de weg weer open, maar er kan nog wel hinder zijn. In die weken werken we namelijk met een om-en-om-regeling.

De werkzaamheden in dijkvak Kanaaldijk zijn naar verwachting eind juni klaar. Aankomende woensdag 18 februari organiseren we een inloopavond over de werkzaamheden bij Kanaaldijk.

U bent van harte welkom tussen 18.30 en 20.00 uur in de hoofdkeet aan Lekdijk Oost 11a in Wijk bij Duurstede. Medewerkers van het waterschap en Lekensembles zijn aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

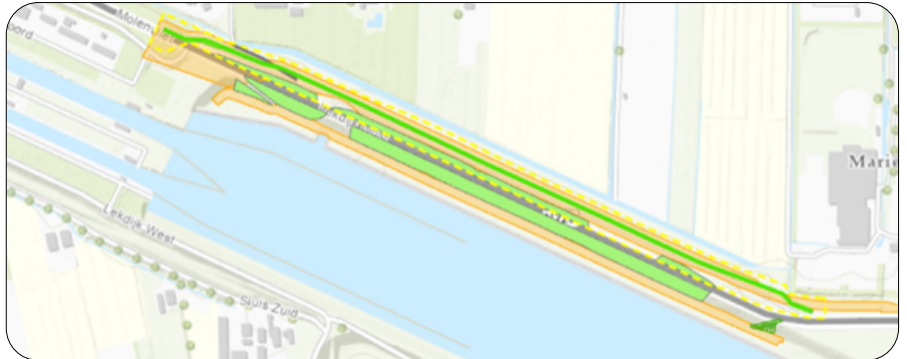

Kaart 2. Locatie van de werkzaamheden tussen de Prinses Irenesluizen en Sportpark Mariënhoeve

Vervolg werkzaamheden

Deze planning is onder voorbehoud

April

Vanaf april beginnen we met het werk aan de buitenkant van de dijk in dijkvak Lunenburgerwaard West. Het werk bestaat uit meerdere stappen. We verwijderen de bovenste grondlaag, doen archeologisch onderzoek, brengen het talud (schuine kant van de dijk) weer in de juiste vorm en leggen speciale bentonietmatten aan.

Juni

Vanaf juni beginnen we met het plaatsen van damwanden in dijkvak Lunenburgerwaard Oost. De werkzaamheden spreiden zich over een langer stuk dijk en gebeurt in delen: een deel voor de bouwvak en een deel erna. We werken van oost naar west. Ook starten we in juni met het vervangen van de houten wand langs de Kromme Rijn, aan de noordkant van de inundatiesluis.

September

In september beginnen we met de werkzaamheden bij de Graanschuur in dijkvak Waterfront. De damwand die in maart langs het inundatiekanaal wordt geplaatst, trekken we door richting de beermuur. De damwandlijn kruist hier de weg. Tijdens het graven van de sleuf en het plaatsen van de damwanden is de weg tijdelijk afgesloten. Over de exacte periode en bereikbaarheid krijgt u ruim van tevoren informatie.

Oktober

Aansluitend op de werkzaamheden tussen het inundatiekanaal en de beermuur, starten we eind oktober met het plaatsen van damwanden tussen de beermuur en het Kasteelpark. De weg bij Lekdijk Oost 2 t/m 5 is dan tijdelijk afgesloten. De haven blijft bereikbaar.

Vervolgwerkzaamheden 2026/2027

In de volgende fase van het project doen we onder andere:

- Werk aan de 'hank', een watergang bij Sluis Amerongen, die we tijdelijk droogleggen om de bodem en wand te verstevigen met klei. Laatste deel damwanden in dijkvak Kolland.
- Het verhogen van de dijk.
- Grondwerk aan de binnenkant van de dijkvakken: Lunenburgerwaard West, Lunenburgerwaard Oost, Sluis Amerongen en Kolland.
- Het aanleggen van een poel voor de poelkikker.

Deze planning is onder voorbehoud

Onze partners:



GEMEENTE
UTRECHTSE HEUVELRUG



PROVINCIE  UTRECHT

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Deelproject Wijk bij Duurstede - Amerongen valt onder het project Sterke Lekdijk, dat deel uitmaakt van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is een landelijke aanpak om dijken in heel Nederland veilig te houden en de waterveiligheid van ons land te waarborgen voor nu en in de toekomst.

Blijf up-to-date!

Ontvang het laatste nieuws over Dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen. Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief via [de website](#) of download de Bouwapp via de [appstore](#) of [playstore](#)

Uitschrijven?

kan via [de website](#)

Contact & informatie

Meer weten over het project?

Kijk op: www.hdsr.nl/sterkelekdijk/wam

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met omgevingsmanagers Sophie Drescher en Margreet van Zee. Vragen over de werkzaamheden kunt u stellen aan Sophie Drescher. Vragen van algemene aard kunt u stellen aan Margreet van Zee.

Sophie.drescher@stormvloed.nl | Margreet.van.zee@hdsr.nl
