

Verslag Impulsregeling Water in de Leefomgeving 2021

Inleiding

Met de *impulsregeling Water in de Leefomgeving* stimuleert het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gemeenten financieel om maatregelen uit te voeren die bijdragen aan de volgende doelen:

- stimulering gemeenten om maatregelen uit te voeren die ook onze (wettelijke) doelen behalen. Met een focus op de doelen van Europese Kaderrichtlijn Water, wateropgave wateroverlast en Ruimtelijke Adaptatie;
- stimulering van gemeenten om hun ambities met betrekking tot stedelijk water(beheer) te vergroten of ontwikkelen.
- Doordat gemeenten zichtbaar uitvoering geven aan het verbeteren van water, draagt dit bij aan het waterbewustzijn van bewoners;
- samenwerking tussen gemeenten en waterschappen bevorderen en zichtbaar te maken;

Voor 2021 is een bedrag van € 650.000,-- beschikbaar gesteld vanuit het budget van de programma's Gezond Water en Klimaatadaptatie.

Verbeteren waterkwaliteit en ecologie in stedelijk gebied	Budget € 500.000,-
Realisatie Wateropgave Wateroverlast	
Verminderen gevolgen piekbuien, gevolgen water tekort, droogte en hitte in stedelijk gebied	Budget € 150.000,-
Versterken van de beleving van en bewustwording over water	Maakt deel uit van beide budgetten

De gemeenten kunnen bij het waterschap maatregelen aandragen die voor een bijdrage in aanmerking kunnen komen. Het waterschap prioriteert de aangedragen maatregelen op basis van diverse criteria.

Belangrijke randvoorwaarden zijn dat gemeenten zelf ambitie hebben en dat het niet om wettelijk verplichte maatregelen gaat. Maatregelen zoals monitoring, regulier onderhoud, onderzoek en planvorming (inclusief bestek opstellen) vallen buiten de cofinanciering.

Het college stemde op 14 december 2016 met de zogenaamde verbreding van de impulsregeling 'Klimaatadaptatie in de Stad'. Deze regeling is omgedoopt tot Impulsregeling Water in de Leefomgeving om geen verwarring te krijgen met de landelijke regeling met dezelfde titel. Onze regeling loopt van 2018 tot en met 2022. Na 2022 is door het college besloten om de regeling te continueren en het budget te vergroten en te verbreden. Zie voor meer informatie www.hdsr.nl/impuls

Beeldverslag Impulsregeling 2021

Deze rapportage gaat over het jaar 2021. De gemeenten konden tot 1 juni 2020 voorstellen indienen. Zeven gemeenten hebben achttien maatregelen ingediend. Het college besloot in juli 2020 aan zeventien maatregelen in zeven gemeenten bij te dragen. Dit jaar werd voor het eerst bijgedragen aan een maatregel van de gemeente Krimpenerwaard. Vervolgens zijn de samenwerkingsovereenkomsten met deze gemeenten getekend.



Overeenkomst met de gemeente Krimpenerwaard

De zeventien maatregelen staan in de volgende tabel. Vier maatregelen zijn uiteindelijk niet doorgegaan en het waterschap heeft daaraan geen bijdrage geleverd. Deze zijn in de tabel doorgehaald.

Gemeente	Maatregel
Bunnik	Klimaatbestendige Oranjebuurt
Krimpenerwaard	Montignylaan en Halve Maan
Lopik	Verbeteren doorstroming Cabauw Oost
Nieuwegein	Drijvend groen "versteende" watergang Putter Doorslag
Nieuwegein	Oplossen kroosprobleem Schansen-Noord
Nieuwegein	Circulair drijvend groen "versteende" watergang Vosseweide
Utrecht	Klimaatbestendig inrichten van het Hooghiemstraplein
Utrecht	Aanleggen natuurvriendelijke oevers ISU Science Park
Utrecht	Aanpak wateroverlast en blauwalg in Veldhuizerplas (Kloosterpark-Meentpark)
Utrecht	Robuuster watersysteem Kasteeltuin Nijvelt
Utrecht	Aanleg natuurvriendelijke oevers MFA De Voorn (Langeraksingel)
Utrecht	Aanleg natuurvriendelijke oevers NPD strook, Brailledreef
Utrecht	Aanpak kroosproblematiek Seychellen, Lunetten
Utrecht	Verbeteren waterkwaliteit en doorstroming Zilveren Schaats
Woerden	Vervangen duikers Molenvliet
Zeist	Natuurvriendelijke oevers Buitenplaatsen Landgoed Hoog Beek & Royen en Pavia
Zeist	Natuurvriendelijke oevers Pestorsbosje
Zeist	Ombouwen VGS naar GS en dichtzetten riooloverstorten


Conform besluit van het college van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op 14 juli 2020 (bestuursvoorstel DM# 1660383)

Uiteindelijk zijn alle maatregelen, op vier na, overeenkomstig het geplande uitgevoerd. De vier maatregelen die niet zijn doorgegaan, zijn door de gemeente (voorlopig) afgeblazen. De reden van het niet doorgaan van de maatregelen zijn divers. Vooral vertraging vanwege tegenvallers bij participatie, capaciteitsgebrek en tegenvallers tijdens de uitvoering (waardoor een forse overschrijding van de geraamde kosten dreigde te ontstaan) waren de oorzaak. Enkele maatregelen moesten nog in 2022 worden afgerond. Twee maatregelen zijn eind 2022 pas gestart. De uitvoering zal in 2023 zeker plaats vinden, omdat het waterschap opdrachtbevestigingen heeft gekregen.

[Toelichting volgende bladzijden](#)

Aan elke maatregel is een pagina gewijd. Per maatregel staat een beschrijving, de locatie, de uitvoering (dimensionering), de oplevering, de argumentatie en bijdrage van het waterschap en foto's, tekeningen en/of mediaberichten.

Gemeente	Krimpenerwaard	Volgnummer	1 (van 1)
Bijdrage HDSR	€ 43.000		
Beschrijving	Verbeteren watersysteem Montignylaan en Halve Maan		
Locatie	Schoonhoven oost		
Uitvoering/ Toelichting	In de omgeving van de Montignylaan en Halve Maan te Schoonhoven ligt een krap gedimensioneerd watersysteem wat in droge perioden makkelijk leidt tot droogvallende watergangen. Bij piekbuien is de afvoermogelijkheid van watersysteem beperkt en treedt snel wateroverlast op. De aan te leggen duiker bij de Montignylaan voorziet in een mogelijkheid voor wateraanvoer in droge tijden voor een peilgebied waar op dit moment geen aanvoer mogelijk is. De vervanging van de duiker onder de Halve Maan verbetert de afvoer van het bovenstrooms gelegen gebied en verkleint daarmee het risico op wateroverlast.		
Oplevering	Begin 2023, plan aangepast (meekoppelen met nieuwbouw, waterpeilen in praktijk klopten niet met data. Daardoor planning ook vertraagd)		
Argumentatie HDSR	De uitvoering van dit project zorgt er voor dat het watersysteem wordt verbeterd. Er komen weer mogelijkheden voor water aan te voeren, zodat droogte minder probleem wordt. We hopen met deze impuls dat de gemeente samen met het waterschap meer gaat werken aan een robuust en klimaatbestendig watersysteem. Afgestemd met Sterke Lekdijk project en watersysteembeheerder. De gemeten waterpeilen klopten niet met beheerdata. Daarom plan nader herzien en vertraagd.		

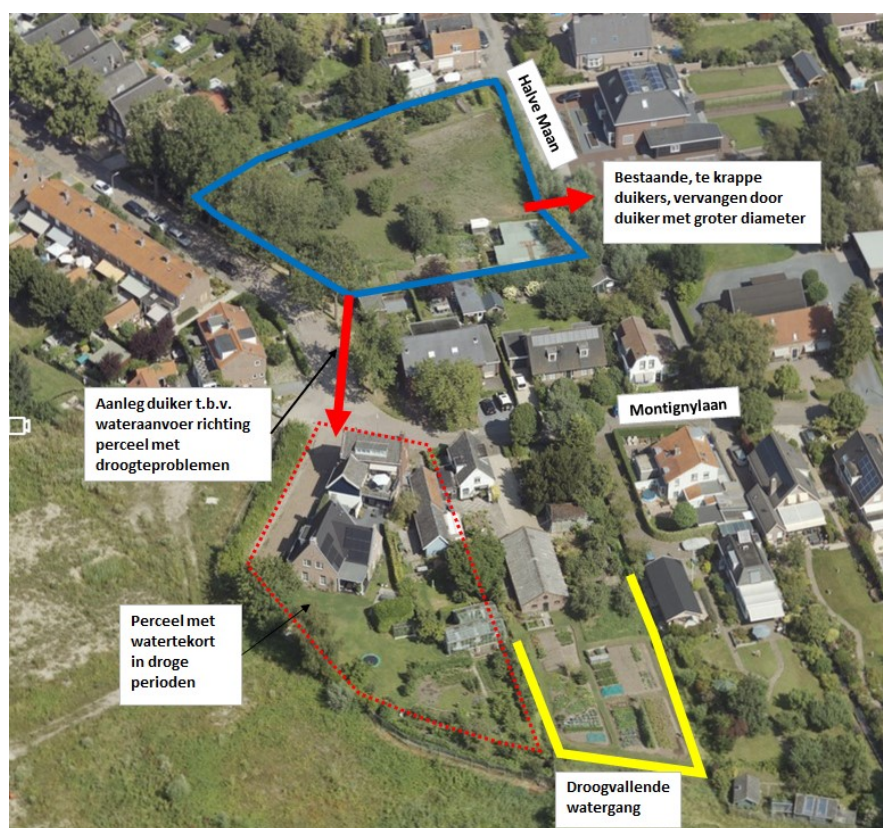

Gemeente	Lopik	Volgnummer	1 (van 1)
Bijdrage HDSR	€ 24.250		
Beschrijving	In Cabauw is al enige jaren overlast door overmatig kroos, zuurstoftekort en daardoor vissterfte. Naast het vergroten van de wateraanvoer is het wenselijk om de doorstroming te verbeteren. Een belangrijk knelpunt zijn drie duikers. Het is wenselijk om duikers op te halen en met lucht te leggen. Uitvoering is afhankelijk van de ligging van kabels en leidingen.		
Locatie	Cabauw		
Uitvoering/ Toelichting	Twee van de drie duikers zijn aangelegd. De locatie Cabauw oost is niet realiseerbaar vanwege de ligging van o.a. het vrijverval riool. Het waterschap heeft de bijdrage verlaagd (2/3 uitbetaald)		
Oplevering	Mei 2021		
Argumentatie HDSR	Door uitvoering van dit project zal de waterkwaliteit en ecologie verbeteren, alsmede de doorstroming in de watergangen. Op deze manier kan de kroosproblematiek worden opgelost. Graag afstemming met het waterschap bij de uitvoering van het project.		



Aanleg duiker Vogelenzangkade



Aanleg duiker Wielsekade



Resultaat Vogelenzangkade



Resultaat Wielsekade

Gemeente	Nieuwegein	Volgnummer	1 (van 3)
Bijdrage HDSR	€ 12.000		
Beschrijving	Drijvend groen "versteende" watergang Putter Doorslag aanleggen. In de zomer van 2018 zijn er problemen opgetreden met betrekking tot de waterkwaliteit in de wijk Doorslag, peilvak NGW_021. Met als gevolg diersterfte, klachten en een slecht imago in de buurt. Een verbetering van de waterkwaliteit door het vastleggen van nutriënten in de biomassa. Daarnaast een verbetering van de biodiversiteit. Ten slotte een verbetering van de beleving van het water. Uitvoering in combinatie met andere verbetermaatregelen.		
Locatie	Doorslag		
Uitvoering/ Toelichting	De vegetatiematten aan de Putter en Vosseweide zijn aangelegd zoals gepland.		
Oplevering	Mei 2022		
Argumentatie HDSR	Het aanleggen van vegetatiematten is een goede optie bij watergangen zonder groene oevers. Naast mogelijke verbetering van fauna en flora, draagt het ook bij aan bewustwording van bewoners. Voorwaarde is dat het onderhoud door de gemeente wordt uitgevoerd.		

Situatie voor aanleg.




Matten vlak na aanleg.



Resultaat na enkele maanden.

Gemeente	Nieuwegein	Volgnummer	2 (van 3)
Bijdrage HDSR	€ 40.000		
Beschrijving	Oplossen kroosprobleem Schansen-Noord Bij de watergang aan de Baarnseveste is in 2019 een kroosslurper geplaatst om het aanwezige kroos weg te krijgen. Dat is gelukt, echter, het kroos heeft zich verzameld verderop in het traject. Namelijk in de watergang tussen de Deventerschans, Beemsterschans en Hoornseschans. Binnenkort wordt de hele buurt gerenoveerd en krijgt deze vijver een speelfunctie met een trekpond. Kroos doet af aan de beleving en kan voor vissterfte zorgen. Daarom willen we de duikers aan de Zegveldseschans en Leusderschans met lucht leggen en groter dimensioneren zodat het kroos weg kan. Uiteindelijk komt de kroos dan terecht in de vijver van het gemaal. De kans dat het zich hier ophoopt is gering.		
Locatie	Schanzen Noord		
Uitvoering/ Toelichting	Aanpakken twee duikers. Het hoger leggen van de duikers bleek niet mogelijk te zijn. Alternatief is in overleg uitgevoerd: Eenzelfde doel wordt bereikt door afkoppelen HWA stelsel, na onderzoek of er foutieve aansluitingen op zitten. Het project is daardoor een jaar vertraagd. Eind 2022 is uitvoering gestart en daarna afgerond.		
Oplevering	Uiteindelijk begin 2023		
Argumentatie HDSR	Door deze relatief eenvoudige maatregel is de verwachting dat het kroosprobleem in de hele wijk wordt opgelost. Het betreft een 'laatste schakel' in al eerder uitgevoerde maatregelen. De maatregel heeft op andere locaties een bewezen effect.		

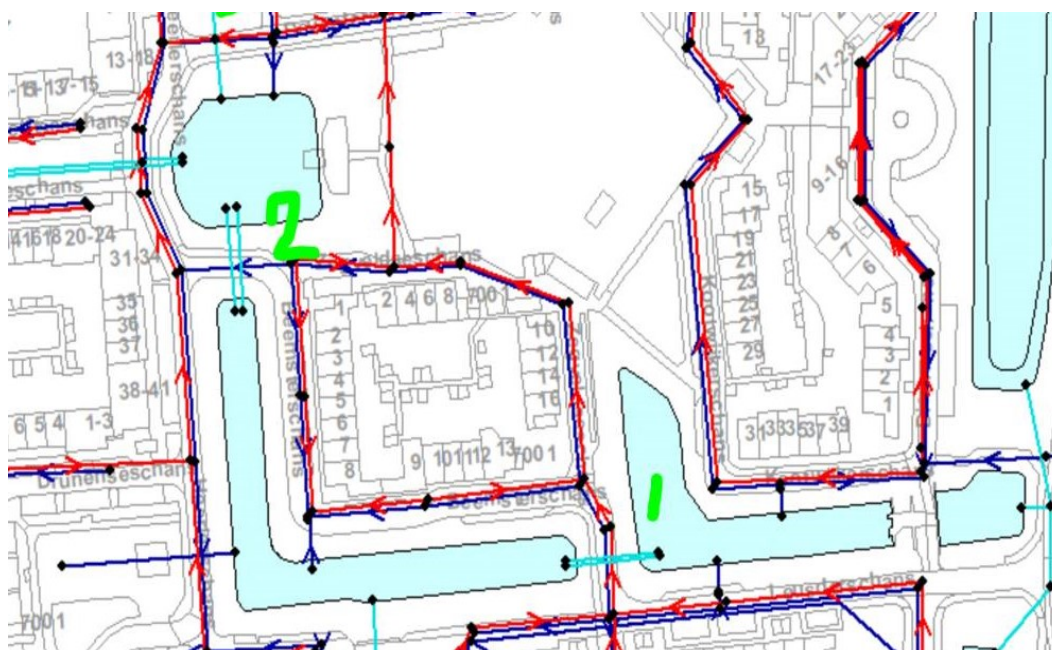

Gemeente	Nieuwegein	Volgnummer	3 (van 3)
Bijdrage HDSR	€ 10.000		
Beschrijving	Circulair drijvend groen "versteende" watergang Vosseweide. In de zomers van 2017 en 2018 zijn er problemen opgetreden met betrekking tot de waterkwaliteit in de wijk Batau-Noord, peilvak NGW_004. Met als gevolg diersterfte en een slecht imago in de buurt. De maatregel dient verschillende doelen. Een verbetering van de waterkwaliteit door het vastleggen van nutriënten in de biomassa. Water met een overschot aan nutriënten kan immers kroosvorming stimuleren. Daarnaast een verbetering van de biodiversiteit. Ten slotte een verbetering van de beleving van het water.		
Locatie	Vosseweide		
Uitvoering/ Toelichting	De vegetatiematten aan de Putter en Vosseweide zijn aangelegd zoals gepland.		
Oplevering	Mei 2022		
Argumentatie HDSR	Door deze relatief eenvoudige maatregel is de verwachting dat het kroosprobleem in de hele wijk wordt opgelost. Het betreft een 'laatste schakel' in al eerder uitgevoerde maatregelen. De maatregel heeft op andere locaties een bewezen effect.		



Resultaat na aanleg.



Details vegetatiematten

Gemeente	Utrecht	Volgnummer	1 (van 5)
Bijdrage HDSR	€ 52.500		
Beschrijving	Klimaatbestendig inrichten van het Hooghiemstraplein door HWA verwijderen en wadi aanleggen. Het plein is op dit moment dichtgelegd met klinkers. De omwonenden en bedrijven willen graag het plein aantrekkelijker, klimaatbestendiger en groener maken. Er is een landschapsarchitect bij betrokken en die heeft een ontwerp gemaakt. Doordat er veel kabels en leidingen in de grond liggen, heeft ze een slim plan bedacht. Door de hemelwaterriolering af te koppelen en te verwijderen, ontstaat plek voor een wadi en toevoeging groen en bomen.		
Locatie	Hooghiemstraplein		
Uitvoering/ Toelichting	Vanwege corona is project uitgesteld en is pas eind 2022 gestart. Uitvoering in 2023. Het waterschap heeft de bijdrage eind 2022 medegefinancierd op basis van zekerheid dat project wordt uitgevoerd. Bewijsvoering is akkoord.		
Oplevering	2023		
Argumentatie HDSR	Prachtig integraal project dat bijdraagt aan uitvoering van het klimaatbestendig maken van de stad. De bewoners zijn betrokken en klimaatadaptatie en verbeteren van de waterkwaliteit worden goed gecombineerd.		



Project voor uitvoering.



Participatie tijdens planvorming, na corona periode.

Gemeente	Utrecht	Volgnummer	2 (van 5)
Bijdrage HDSR	€ 50.000		
Beschrijving	Robuuster watersysteem Kasteeltuin Nijeveld, Aanleg nieuwe watergang, drie bruggen in plaats van duikers, samenvoegen peilgebieden. De gracht van het voormalig kasteel Nijeveld en de nabijgelegen watergangen op de locatie van de voormalige kasteeltuin zijn twee kleine afzonderlijke peilgebiedjes. In het kader van masterplan kunnen de twee peilgebieden samengevoegd worden. Het watersysteem wordt hierdoor robuuster (groter aaneengesloten systeem en minder doodlopende watergangen).		
Locatie	Kasteel Nijeveld ligt in Milan Viscontipark in De Meern		
Uitvoering/ Toelichting	Project is vertraagd uitgevoerd. De benodigde materialen konden niet op tijd worden aangeleverd. Daarnaast zijn archeologische items gevonden.		
Oplevering	Eind 2022		
Argumentatie HDSR	Door de uitvoering van de maatregelen zal lokaal een verbetering van het watersysteem, waterkwaliteit en bewustwording worden gerealiseerd. We kunnen niet volledig meefinancieren, omdat het project te groot is voor deze impulsregeling.		



ruimteontgeng
Stadsontgeng
Telefoon 14 030
E-mail gru@stadsontgeng.nl
www.stadsontgeng.nl

Wijkbericht

augustus 2021

Start uitvoering herinrichting Kasteeltuin Nijeveld

Na de vakantie start de uitvoering van het ontwerp voor Kasteeltuin Nijeveld. Voordatgaand laten we te gasten een archeologisch onderzoek doen. Dit is nodig om later een steen te graven. In dit wijkbericht leest u meer over de werkzaamheden.

Start werkzaamheden

De aanpak start 1 augustus met het onderzoek op de plek waar de rivier stroomt. Bij dit onderzoek graven archeologen de grond heel nauwkeurig af. Dit is nodig omdat het park een archeologisch rijksmonument is. Aanstaand begint de uitvoering van het ontwerp voor de kasteeltuin. De planning is om het werk in januari 2022 op te breken.

Het is vooral niet precies te zeggen hoeveel en wat de archeologen vinden. Mogelijk loopt de planning hierdoor uit.

Togankelijkheid park en moerasen

Tijdens de archeologische opgraving is het grootste deel van het park toegankelijk. Alleen het deel waar we de archeologische opgraving doen zullen we af met bouwhekken.

Vanaf 1 september is het park niet meer toegankelijk. Over het gebruik van de moerasen maken we specifieke afspraken met Utrecht Natuurlijk.

Omliggende bomen

We hebben bomen om via de westkant van het park. Borden geven de omliggende route aan.

Ontwerp kasteeltuin Nijeveld

Kasteeltuin Nijeveld is de nieuwe naam voor het De Milan Viscontipark. In 2019 is samen met bewoners een masterplan opgesteld om het park om te vormen tot Kasteeltuin Nijeveld. In 2020 is een deel al aangelegd: de speelveld van de laatste van het park. Inmiddels is voldoende geld beschikbaar: zijn alle benodigde vergoedingen verleend en kunnen we de rest van het plan uitvoeren. We gaan de historische structuren in het park weer zichtbaar maken en er een fijne plek van maken om te kluisteren, te spelen, te sluiten, te wandelen en te ontspannen. Wat is het ontwerp schied? Dat kan op www.stadsontgeng.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over de uitvoering van het project kunt u contact opnemen met de kasteelbouder Gerard van Leur of directbeveerder Dick Doorn via 14-030.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen via e-mail gru@stadsontgeng.nl.


Mocht u zin hebben om vanaf volgend jaar met andere buurtbewoners te kluisteren in de moerasen dan kan dat! U kunt contact opnemen met Marlies van den Heuvel van Utrecht Natuurlijk via e-mail marlies@stadsontgeng.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij wijkbureau Vleuten-De Meern, Dorpsplein 1, Vleuten, of via telefoonnummer 14-030.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.



Gemeente	Utrecht	Volgnummer	3 (van 5)
Bijdrage HDSR	€ 15.000		
Beschrijving	Aanleg natuurvriendelijke oevers bij MFA De Voorn (Langeraksingel), Langs primaire watergang een talud verflauwen en daarmee een natuurvriendelijk oever realiseren.		
Locatie	Langerakbaan		
Uitvoering/ Toelichting	Project is conform uitgevoerd.		
Oplevering	Eind 2021 afgerond, beplanting begin 2022.		
Argumentatie HDSR	Dit project draagt bij aan de verbetering van waterkwaliteit en bewustwording. Het lost een probleem op dat vanuit de ecoscan naar voren kwam. We vragen de gemeente om de naastgelegen school te betrekken bij het beheer en onderhoud van de NVO.		

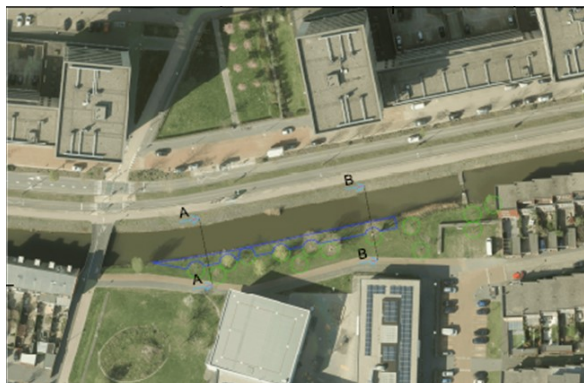

Locatie



Werk tijdens uitvoering



Resultaat kort na oplevering

Gemeente	Utrecht	Volgnummer	4 (van 5)
Bijdrage HDSR	€ 22.500		
Beschrijving	Aanleg natuurvriendelijke oevers NPD strook		
Locatie	Brailledreef		
Uitvoering/ Toelichting	Project is conform uitgevoerd.		
Oplevering	Eind 2021 afgerond		
Argumentatie HDSR	Prima kans om bij een ruimtelijke ontwikkelingen meteen een verbeterslag voor ecologie en waterkwaliteit te realiseren. Dit samen met al eerder uitgevoerde maatregelen in de buurt. Daarnaast heeft de gemeente goed nagedacht over beheer en onderhoud samen met bewoners.		



Aanleg in volle gang met drijvende pontons.



Gemeente	Utrecht	Volgnummer	5 (van 5)
Bijdrage HDSR	€ 23.000		
Beschrijving	Aanpak kroosproblematiek Seychellen door ophalen van duiker.		
Locatie	Lunetten		
Uitvoering/ Toelichting	Project is conform uitgevoerd.		
Oplevering	Eind 2021		
Argumentatie HDSR	Het ophalen van een duiker is een bewezen methode om de waterkwaliteit te verbeteren. Naar verwachting zal ophoping van kroos tot het verleden behoren en daarmee de klachten van bewoners. We verwachten dat het project relatief makkelijk is uit te voeren.		



De nieuwe duiker

Gemeente	Woerden	Volgnummer	1 (van 1)
Bijdrage HDSR	€ 79.500		
Beschrijving	Vervangen twee duikers Bekenlaan Molenvliet Na overleg met gemeente worden enkel de twee duikers aan de Bekenlaan vervangen (De Beerze en De Polderbaan). Dit omdat de toegekende bijdrage lager is dan aangevraagd.		
Locatie	Bekenlaan Molenvliet		
Uitvoering/ Toelichting	Vertraging in uitvoering doordat kabels opgepakt moeten worden door bedrijf. Vertraging meer dan een jaar. Eind 2022 is duidelijk opdracht gegeven. Ook vertraging door personeelscapaciteit bij gemeente.		
Oplevering	Uitvoering begin 2023.		
Argumentatie HDSR	Door het vervangen van twee duikers aan de Berkenlaan in de wijk Molenvliet, is de verwachting dat het kroosprobleem in de hele wijk wordt opgelost en bijdraagt aan de verbetering van doorstroming om wateroverlast in de wijk te verminderen. Het betreft een 'laatste schakel' in al eerder uitgevoerde maatregelen van de afgelopen jaren (vervangen van de duikers "achterin" het watersysteem in de woonwijk is nu aan de orde). De maatregel heeft op andere locaties in de wijk een bewezen effect opgeleverd.		

Persbericht ondertekening overeenkomst: [Schoon en gezond water in Molenvliet - HDSR](#)



Situatie voor uitvoering


Gemeente	Zeist	Volgnummer	1 (van 2)
Bijdrage HDSR			
Beschrijving	Natuurvriendelijke oevers Buitenplaatsen Landgoed Hoog Beek & Royen en Pavia. Beide buitenplaatsen hebben een rijke cultuurhistorie. De vijvers werden in het verleden gevoed door middel van een spreng vanuit het Zeisterbos. Deze spreng is lang geleden droog gevallen, al in 1915 werd er gesproken over het zoeken naar een oplossing voor de drooggevalle spreng. We willen de ecologisch en belevingswaarde vergroten door aanleg van natuurvriendelijke oevers. Door deze aanpak verbetert de waterkwaliteit en vergroten we de belevingswaarde van het water.		
Locatie	Landgoed Hoog Beek & Royen en Pavia		
Uitvoering/ Toelichting	Vertraging in uitvoering van de aanleg. In overleg is eind 2022 aangegeven dat project zeker doorgaat. Inclusie aanvullende activiteiten zoals afkoppelen regenwater van gebouwen is project akkoord bevonden.		
Oplevering	Eind 2022 is projectopdracht gegeven, oplevering 2023.		
Argumentatie HDSR	Door uitvoering van dit project wordt behoud van cultuurhistorie (sprengen) en verbetering van ecologie goed gecombineerd. Een mooi voorbeeldproject en onderdeel van de Blauwe Agenda. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en afkoppelen gebouwen, in combinatie met de uitvoering van achterstallig onderhoudsmaatregelen, verwachten we een verbetering van ecologie en waterkwaliteit. We kunnen niet volledig meefinancieren, omdat het project te groot is voor deze impulsregeling. Voorwaarde van toekenning bijdrage is dat de gemeente beheer en onderhoud afspraken maakt.		



Nieuwe beschoeiing voor slingervijver Pavia

ZEIST De slingervijver op buitenplaats Pavia krijgt nieuwe beschoeiing. Dat gebeurt in het kader van het project 'Robuust watersysteem Zeister bos en landgoederen' dat het Utrechts Landschap uitvoert. Het project zorgt voor een verbetering voor natuur, cultuurhistorie, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Tijdens een van zijn vele wandelingen maakte Henk van Limpt een foto van het werk in uitvoering.

Krantenartikel aankondiging.

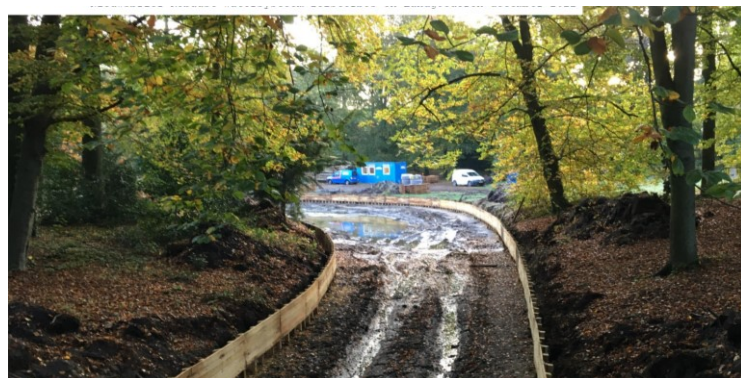

Vorbereidende werkzaamheden


Gemeente	Zeist	Volgnummer	2 (van 2)
Bijdrage HDSR	€ 7.500		
Beschrijving	Ombouwen Verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS) naar gescheiden stelsel (GS), aanleg wadi én dichtzetten riooloverstorten. Veel hemelwater stroomt via de verbeterd gescheiden stelsel alsnog naar de zuivering en leidt bij hevige neerslag tot riooloverstorten. Met als gevolg slechtere waterkwaliteit in Zeist-West (zie Ecoscans)		
Locatie	wijken Parmentiersland en Componistenbuurt		
Uitvoering/ Toelichting	Uitgevoerd conform projectplan.		
Oplevering	Eind 2022 opgeleverd.		
Argumentatie HDSR	Door uitvoering van dit project zal het watersysteem en waterkwaliteit verbeteren. We verwachten dat de gemeente in de toekomst meerdere wijken in Zeist om gaat vormen. Daarom dragen we bij met de Impulsregeling. Conform de richtlijnen van de impulsregeling dragen we alleen bij aan maatregelen die in 2021 worden uitgevoerd: onderzoek en verhelpen foute aansluitingen en dichtzetten overstorten.		



Aanleg wadi.



Wisselen aansluitingen huizen

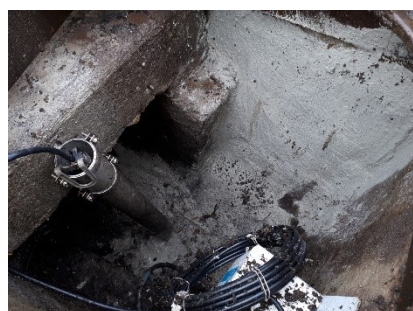

Dichtzetten riooloverstort (van VGS naar GS)

Gemeente	Omschrijving project	Totale projectkosten volgens gemeente	HDSR bijdrage uit Impulsregeling	HDSR Betaalde bijdrage
Bunnik	Klimaatbestendige Oranjebuurt	€4.320.000	€60.000	€ 0
Krimpenerwaard	Montignylaan en Halve Maan	€117.500	€43.000	€43.000
Lopik	Verbeteren doorstroming Cabauw Oost	€48.511	€24.250	€24.250
Nieuwegein	Drijvend groen "versteende" watergang Putter Doorslag	€24.000	€12.000	€12.000
Nieuwegein	Oplossen kroosprobleem Schansen-Noord	€80.000	€40.000	€40.000
Nieuwegein	Circulair drijvend groen "versteende" watergang Vosseweide	€20.000	€10.000	€10.000
Utrecht	Klimaatbestendig inrichten van het Hooghiemstraplein	€105.000	€52.500	€52.500
Utrecht	Aanleggen natuurvriendelijke oevers ISU Science Park	€81.500	€40.750	€ 0
Utrecht	Aanpak wateroverlast en blauwalg in Veldhuizerplas (Kloosterpark-Meentpark)	€233.000	€100.000	€ 0
Utrecht	Robuuster watersysteem Kasteeltuin Nijeveld	€200.000	€50.000	€50.000
Utrecht	Aanleg natuurvriendelijke oevers MFA De Voorn (Langeraksingel)	€30.000	€15.000	€15.000
Utrecht	Aanleg natuurvriendelijke oevers NPD strook, Brailledreef	€45.000	€22.500	€22.500
Utrecht	Aanpak kroosproblematiek Seychellen, Lunetten	€46.000	€23.000	€23.000
Woerden	Vervangen duikers Molenvliet	€220.000	€79.500	€79.500
Zeist	Natuurvriendelijke oevers Buitenplaatsen Landgoed Hoog Beek & Royen en Pavia	€200.000	€60.000	€60.000
Zeist	Natuurvriendelijke oevers Pestersbosje	€20.000	€10.000	€ 0
Zeist	Ombouwen VGS naar GS en dichtzetten riooloverstorten	€40.000	€7.500	€7.500
	TOTAAL	€ 5.895.511	€ 650.000	€ 439.250

Niet alle projecten zijn (op tijd) uitgevoerd. De financiële bijdragen van het waterschap vervallen uiterlijk eind 2022. Het restant vloeit terug in de algemene middelen van het waterschap.
